

## **REPORT QUINDICINALE N. 30**

**Periodo di riferimento: 16 Aprile 2012 – 30 Aprile 2012**



## INDICE REPORT

1. DATI GENERALI .....	3
2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE .....	4
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE.....	5
3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno.....	5
1.1. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato .....	6
4. SEZIONE CANTIERI .....	7
4.1. Elenco cantieri fissi .....	7
4.1.1. CANTIERE STAZIONE .....	8
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE .....	9
4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO .....	10
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA .....	11
4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....	12
4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' .....	14
4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI .....	21
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE .....	22
4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI .....	23

## 1. DATI GENERALI

**OGGETTO:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA VELOCITA' DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell'Affidamento a Contraente Generale).


**COMMITTENTE:** Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**ALTA SORVEGLIANZA:** ITALFERR S.p.A.

**CONTRAENTE GENERALE:** NODAVIA, costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)

- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE	10/03/2010
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE	13/10/2010
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale):	27/08/2015
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):	15/11/2016

## 2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

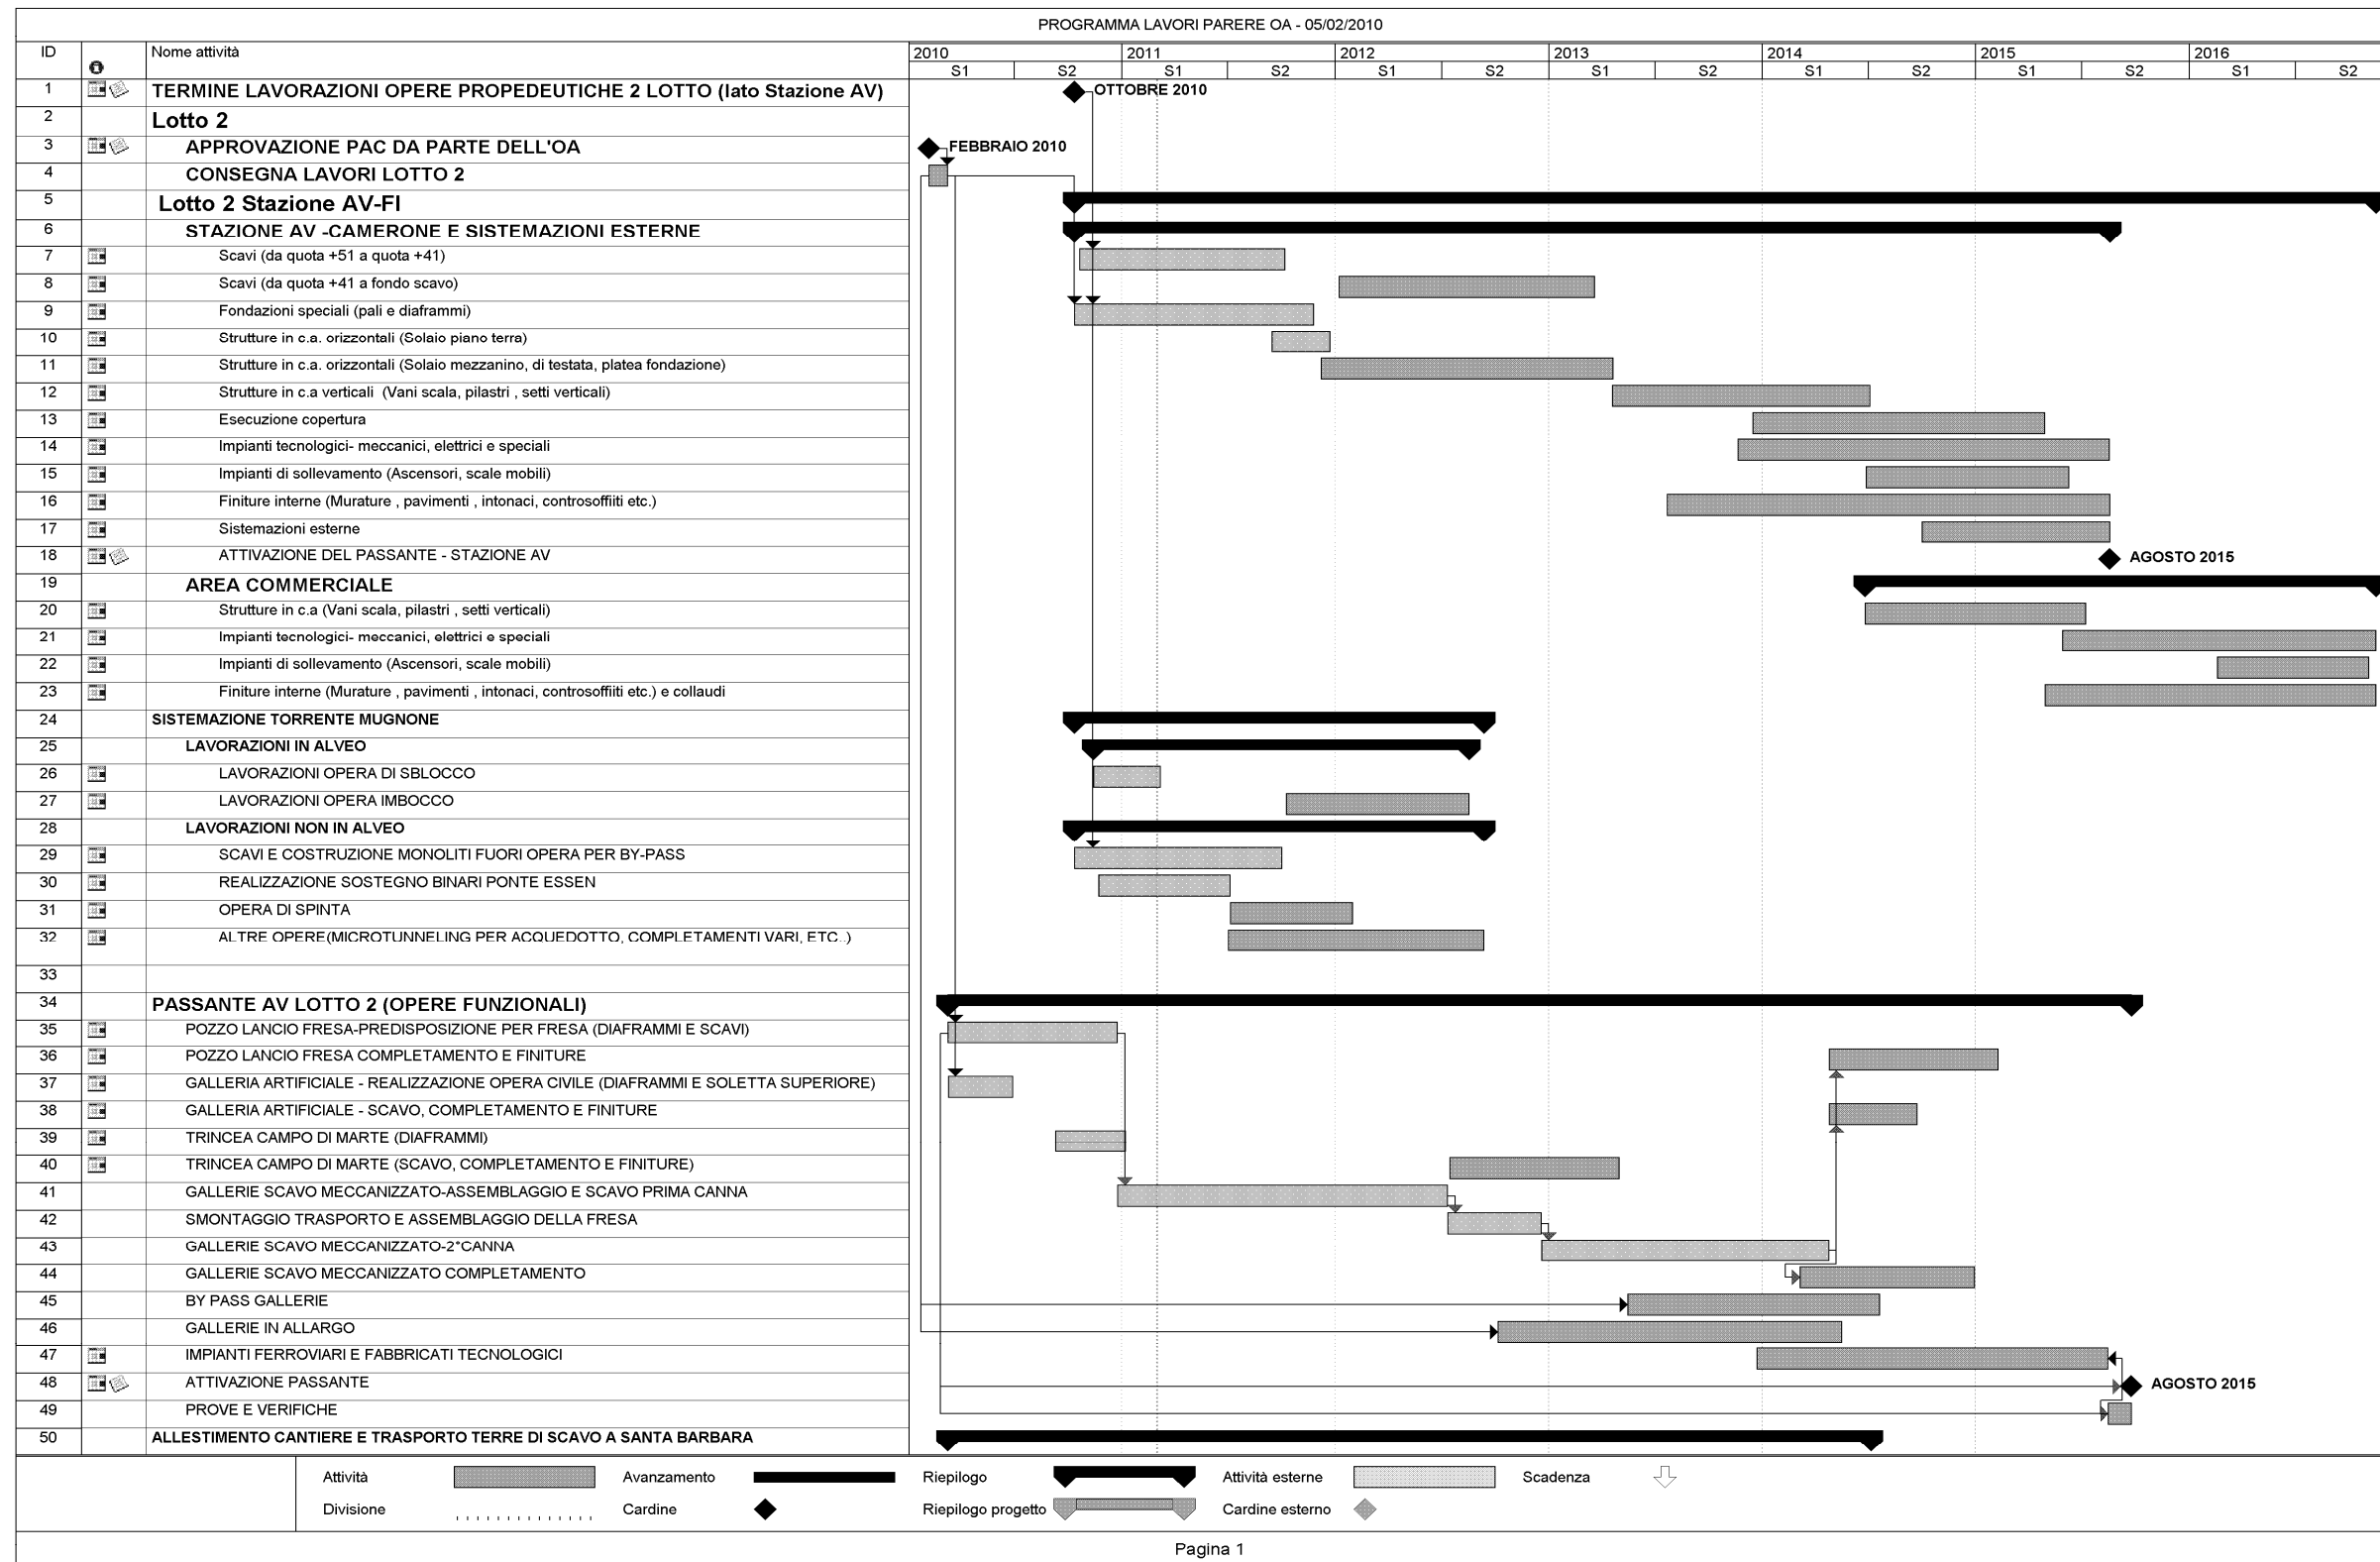

### 3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

#### 3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

PROGRAMMA LAVORI LOTTO 2														SEZ. 2	
REPORT QUINDICINALE N. 30														ATTIVITA' ANNO 2012	
Periodo di riferimento 16/04/12 - 30/04/12															
ID	Nome attività	% Avanzamento progressivo	2012	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5	<b>Lotto 2 Stazione AV-FI</b>														
6	<b>STAZIONE AV -CAMERONE E SISTEMAZIONI ESTERNE</b>														
7	Scavi (da quota +51 a quota +41)	40 %													
9	Fondazioni speciali (pali e diaframmi)	50 %													
10	Pozzo costruttivo Nord (diaframmi, consolidamenti e scavo)	50 %													
28	<b>SISTEMAZIONE TORRENTE MUGNONE</b>														
27	<b>LAVORAZIONI IN ALVEO</b>														
29	LAVORAZIONI OPERA DI SBocco *	0 %													
30	<b>LAVORAZIONI NON IN ALVEO</b>														
31	SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS *	0 %													
32	REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN *	0 %													
38	<b>PASSANTE AV LOTTO 2 (OPERE FUNZIONALI)</b>														
37	POZZO LANCIO FRESA - PREDISPOSIZIONE PER FRESA (DIAFRAMMI E SCAVI)	100 %													
44	GALLERIE SCAVO MECCANIZZATO-ASSEMBLAGGIO E SCAVO PRIMA CANNA	5 %													
45	Realizzazione Compensation Grouting Fortezza da Basso (attività vincolata da nulla osta Ente Fiere)	0 %													
48	Cantierizzazione e realizzazione pozzi per Compensation Grouting Fortezza da Basso	0 %													
59	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA</b>														
60	ALLESTIMENTO CANTIERE E TRASPORTO TERRE DI SCAVO A SANTA BARBARA	75 %													

Attività vincolata da nulla osta Ente Fiere

\* ATTIVITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE

Pagina 1

## 1.1. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato

## **4. SEZIONE CANTIERI**

### **4.1. Elenco cantieri fissi**

- **CANTIERE STAZIONE**
- **BY PASS MUGNONE**
- **CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO**
- **AREA FORTEZZA**

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1

REPORT QUINDICINALE N.29

Periodo di riferimento: 01 Apr 2012 – 15 Apr 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2012	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-29 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
SCAVI (da quota +51 a quota +41)	21/11/2011	11/01/2013	418	40%														Attività ripianificata a seguito di richieste Arpat
SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)																		
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)	13/10/2010	26/02/2013	868	50%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano terra)																		
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)																		
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala, pilastri, setti verticali)																		
ESECUZIONE COPERTURA																		
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI																		
FINITURE INTERNE (Murature, pavimenti, intonaci, controsoffitti etc.)																		
POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi, consolidamenti e scavo)	09/08/2010	30/11/2012	845	50%														

ATTIVITA' REALIZZATA  
 ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

CANTIERE BY PASS MUGNONE

SEZ. 4.1

**REPORT QUINDICINALE N.30**

Periodo di riferimento: 16 Apr 2012 – 30 Apr 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2012	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-29 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
<u>LAVORAZIONI IN ALVEO</u>																		
LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO																		Attività in corso di definizione
LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO																		
<u>LAVORAZIONI NON IN ALVEO</u>																		
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS																		Attività in corso di definizione
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN																		Attività in corso di definizione
OPERA DI SPINTA																		
ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO

SEZ. 4.1

REPORT QUINDICINALE N.29

Periodo di riferimento: 01 Apr 2012 - 15 Apr 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2012	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-29 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
ASSEMBLAGGIO FRESA	03/03/2012	12/05/2012	70															
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON ATTRAVERSAMENTO A PIENO)	15/05/2012	10/01/2013	240															
MANUTENZIONE FRESA																		
SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE																		
SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)																		
MANUTENZIONE FRESA																		
ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE																		
SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA

SEZ. 4.1

**REPORT QUINDICINALE N.30**

Periodo di riferimento: 16 Apr 2012 – 30 Apr 2012


	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - APRILE 2012	16-31 DIC	01-15 GEN	16-31 GEN	01-15 FEB	16-29 FEB	01-15 MAR	16-31 MAR	01-15 APR	16-30 APR	01-15 MAG	16-31 MAG	01-15 GIU	16-30 GIU	NOTE
<i>CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE RASTRIGLIA - FASE A</i>																		Attività in corso di programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4																		
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (TAM)																		
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI																		
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI																		
<i>CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE CAVANIGLIA - FASE A</i>																		Attività in corso di programmazione
POZZI COMPENSATION N.1-2																		
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE																		
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI																		
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

## 4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

### Cantiere Operativo Stazione A.V.

- Prosegue la realizzazione dei diaframmi del camerone AV – filo OVEST (foto 1);
- Sono iniziate le attività di sbancamento delle terre interne al Camerone da quota +46,00 m a +44,00 m s.l.m. (foto 2);
- E' stata completata la trave di coronamento paratia diaframmi n° 5 a contenimento dei fabbricati di Via ZEFFIRINI (foto 3);

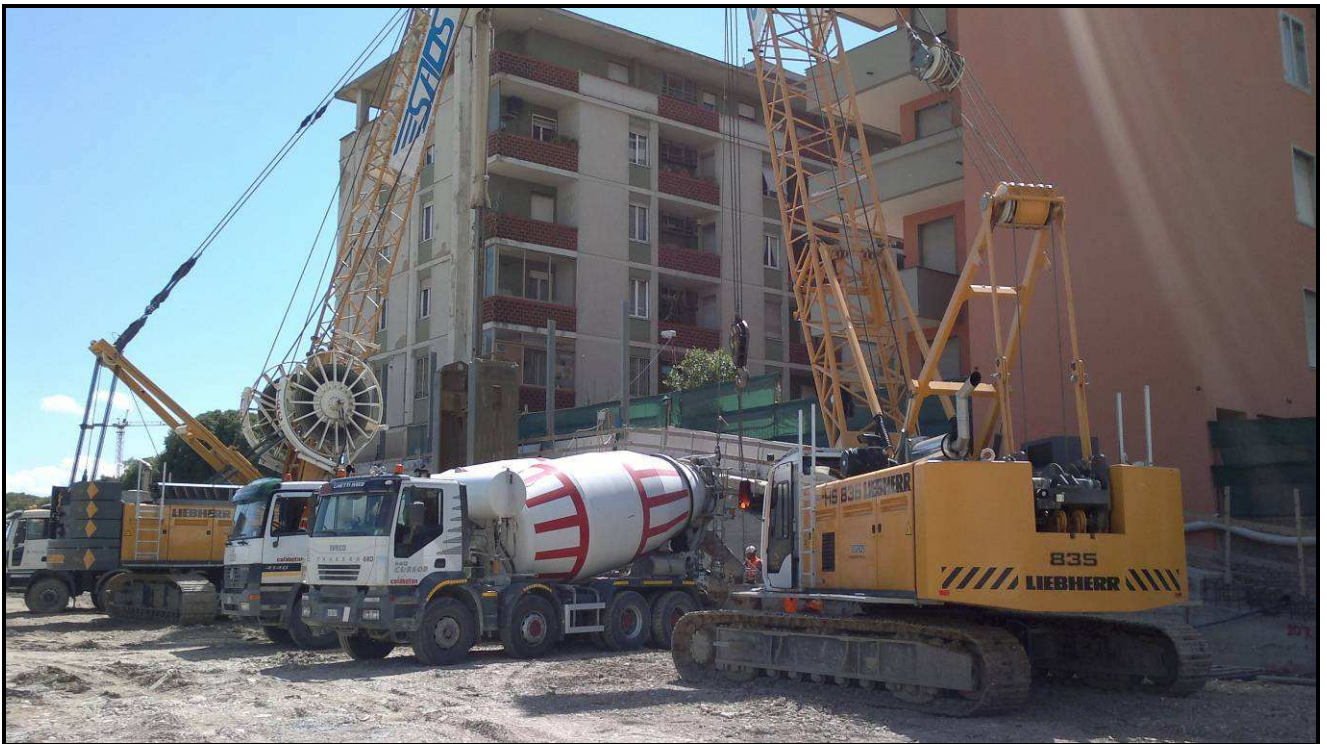

*Foto 1: Diaframmi del camerone (filo OVEST)*



*Foto 2: sbancamento da quota +46,00 m a +44,00 m s.l.m.*



*Foto 3: trave coronamento Paratia n°5*

## **PASSANTE AV**

### **Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette – Opere in corso di realizzazione**

- Sono in corso le attività connesse all'assemblaggio del back-up della TBM all'interno del pozzo lancio frese (foto 1);
- Continuano le attività connesse alla realizzazione della struttura interna in c.a. della Trincea (foto 2);
- Sono in corso le attività legate all'assemblaggio delle componenti della TBM (foto 3);
- E' in corso l'approvvigionamento dei conci prefabbricati di rivestimento delle gallerie (foto 4);
- È in corso l'assemblaggio delle strutture del nastro necessario al trasporto dello smarino (foto 5);
- Sono in corso le attività di perforazione per la posa in opera delle apparecchiature di monitoraggio (foto 6);
- Sono in corso le attività di verniciatura a protezione dei ferri di ripresa delle pareti del pozzo lancio frese (foto 7);
- Sono in corso le attività legate alla ricostruzione del binario in località S. Giovanni Valdarno (foto 8).



*FOTO 1 – Pozzo Lancio Frese – assemblaggio back-up TBM*



*FOTO 2 – Trincea - continua la realizzazione della struttura interna in c.a.*

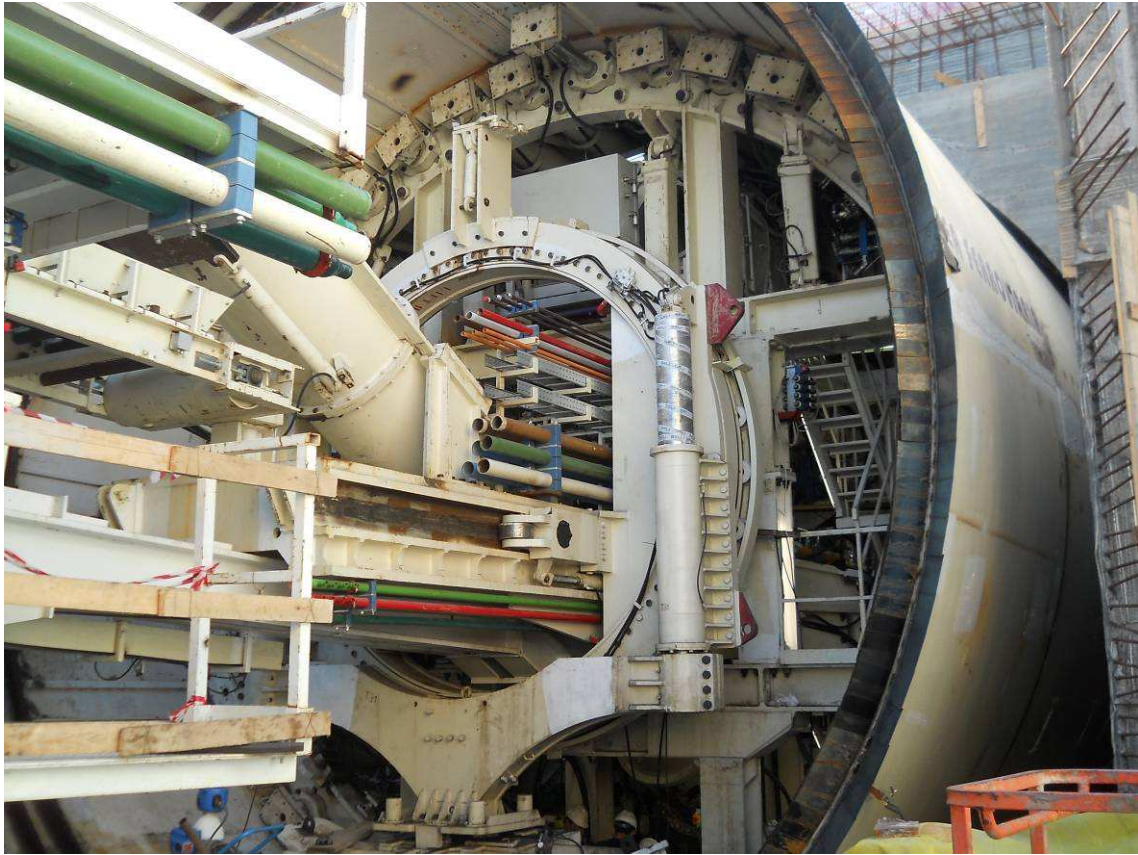


FOTO 3 – Pozzo lancio frese – assemblaggio componenti TBM



FOTO 4 – Pozzo lancio frese – approvvigionamento conchi prefabbricati



FOTO 5 – Assemblaggio strutture nastro trasporto smarino



FOTO 6 – Perforazioni necessarie alla posa delle apparecchiature di monitoraggio

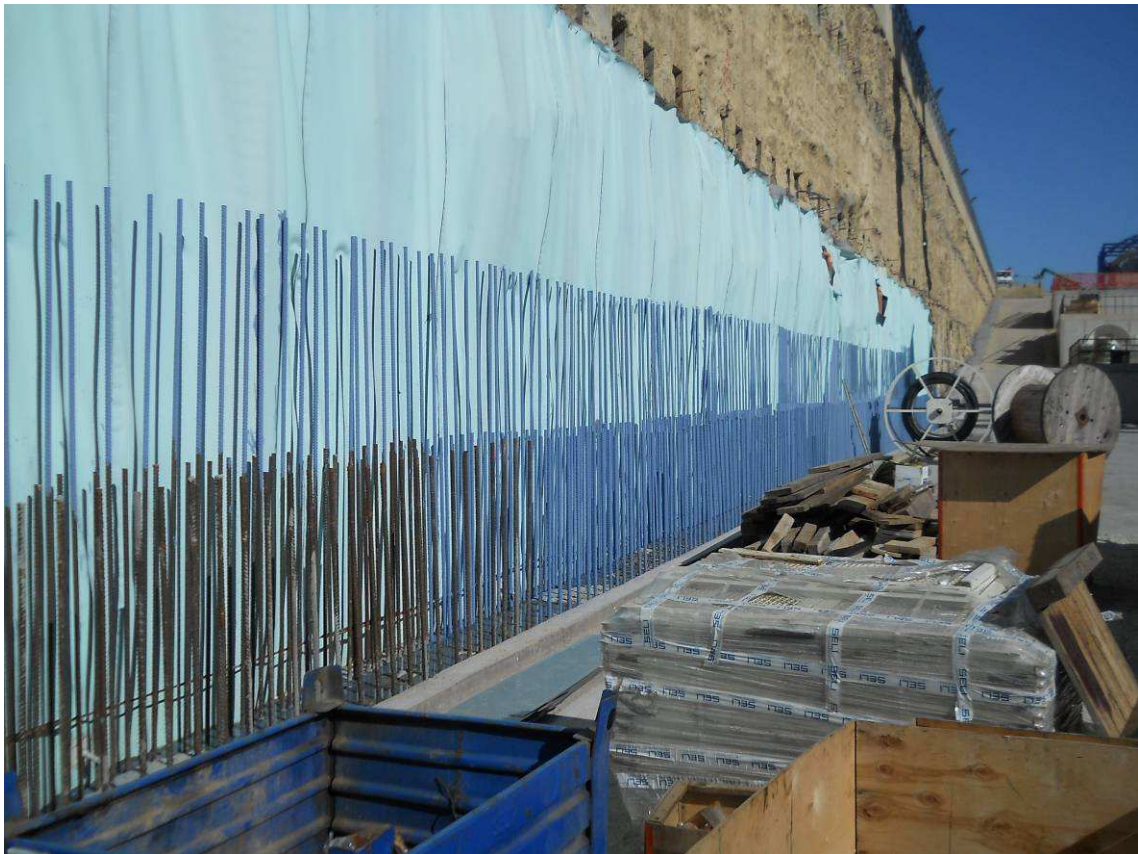


FOTO 7 – Pozzo lancio frese - Verniciatura a protezione delle riprese



FOTO 8 – Località S. Giovanni Valdarno – ricostruzione binario

## 4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

### SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUTOR. RICH.	PERIODO		AUT. GIA' RICHIES TA	DETERMINA AUTORIZZATA	NECES. EVENTI PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2 - FA	MIGNONE Via Cossera	imbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico	Entro novembre 2012	-	NO	NO		durata prevista 12 mesi	
Lotto 2 - FA	MIGNONE Viale Fiedl	sbocco Mugnone	occupazione suolo pubblico	Entro luglio 2012	-	NO	NO		durata prevista 18 mesi	
Lotto 2 - ST	Viale Corsica	via di fuga	passo carrabile	01/09/2011	30/12/2017	SI	SI		ristituzione area a fine lavori	Allegato n.1
Lotto 2 - FA	Viale Strozzi inc. P.le Montelungo	Realizzazione Pozzo di compensation	restringimento corsia	-	-	NO			Attività in corso di riprogrammazione - durata prevista 3 mesi	
Lotto 2 - FA	Viale Strozzi	Realizzazione Pozzo di compensation	chiusura corsia di superficie	-	-	NO			Attività in corso di riprogrammazione - durata prevista 3 mesi	
Lotto 2 - FA	Via L. Giordano	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Botticelli	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Fra Bartolommeo	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Masaccio	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Fra S. Maruffi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Giacomini	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via L. da Vinci	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Viale Don Minzoni	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Piazza della Libertà	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Viale S. Lavagnini	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via C. Landino	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Poliziano	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Bonifazio Lupi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Leone X	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Viale Strozzi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Dionisi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Delle Ghiacciaie	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Feri	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Cittadella	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a lettura puntuali	
Lotto 2 - FA	Via Collina Rovezzano	campo Base Rovezzano	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			Richiesta di autorizzazione in fase di formalizzazione - durata prevista 1 mese	
Lotto 2 - FA	Via Collina Rovezzano	campo Base Rovezzano	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	NO			Richiesta di autorizzazione in fase di formalizzazione - durata prevista 1 mese	

Allegato 1 : Passo carrabile via di fuga Via Corsica



## 4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

### SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

Ente per rilascio autorizzazione	CANTIERE	TIPOLOGIA AUTOR. RICH.	AUT. GIA' RICHIESTA	DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE RILASCIATA	PERIODO		NOTE
						INIZIO	FINE	
COMUNE DI FIRENZE	CAMPO DI MARTE	DEROGA AL RUMORE	SI	06/05/2010	NO	-	-	In attesa dell'autorizzazione da parte del Comune già inviate le integrazioni in data 8/11/2010 e 30/11/2010
COMUNE DI FIRENZE	POZZO NORD	DEROGA AL RUMORE	SI	17/11/2010	NO	-	-	In attesa dell'autorizzazione da parte del Comune
PROVINCIA DI FIRENZE	CAMPO DI MARTE	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	-	-	in attesa autorizzazione concessione rilasciata proroga per prove di portata di ulteriori 6 mesi
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	06/05/2010	NO	-	-	In attesa dell'autorizzazione da parte del Comune già inviate le integrazioni in data 12/1/2011
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	-	-	in attesa autorizzazione concessione rilasciata proroga per prove di portata di ulteriori 6 mesi
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	SI	14/12/2011	14/12/2015	
PROVINCIA DI FIRENZE	POZZO NORD	RICHIESTA AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	11/11/2010	SI	23/04/2012	31/12/2013	
AATO 3	POZZO NORD	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	NO			
PROVINCIA DI FIRENZE	PASSANTE AV	RICHIESTA AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	11/11/2010	SI	24/04/2012	31/12/2013	SOLO PER LA G02 IN ATTESA DELLA GA03 E TR01

## 4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE

## 4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

<b>SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE</b>
<b>aggiornamento 30.04.2012</b>
<b>ditte</b>
A.T.I.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.
AT Sistemi Tecnologici s.r.l.
COLABETON S.p.A.
ECOGEST S.r.l.
ESSE.TI.A. S.r.l.
FOCARDI ANTONIO s.n.c.
GRAZZINI Cav. Fortunato S.p.A.
HIDRA s.r.l.
I.A.R. S.r.l.
ITALGRU' s.r.l.
MUGELLO LAVORI S.P.A.
SICURITALIA GROUP S.p.A.
TECNOLAB S.r.l.
TREVI S.p.A.
HTR s.r.l.
VARVARITO LAVORI s.r.l.
SAOS srl
STN Studio
Technosoil srl
Sonedile srl
Castelfer
Centroferro

## SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

**aggiornamento 30.04.2012**

**ditte**

ARTE METALLICA S.r.l.

A.T.I.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

A.T.I.: TRENITALIA S.p.A. Divisione CARGO - TRE T S.p.A.

A.T.I.: DABEGAL S.r.l. - NEW LIGHT S.n.c. - TERMOIDRAULICA SALVARANI

AT-SISTEMI TECNOLOGICI S.r.l.

CAF s.c.r.l.

CALABRESE AUTOGRU' S.r.l.

ECOGEST S.r.l.

ELETTRI-FER s.r.l.

FALESIA s.r.l.

FERROBERICA s.r.l.

FOCARDI ANTONIO s.n.c.

GRAZZINI Cav. F. S.p.A.

HTR s.r.l.

I.A.R. S.r.l.

LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. S.r.l.

PH s.r.l.

SELI S.p.A.

SCAF s.c.r.l.

SCALA VIRGILIO & Figli S.p.A.

SICABETON S.p.A.

SICURITALIA GROUP S.p.A.

SONDELEDILE S.r.l.

SYNCROSALD di Angotti Guido

TECNOCONTROLLI s.r.l.

TECNOMANTO s.r.l.

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

TREVI S.p.A.

UNICALCESTRUZZI Sp.A.

VARVARITO LAVORI s.r.l.
