

REPORT QUINDICINALE N. 44

Periodo di riferimento: 16 Novembre 2012 – 30 Novembre 2012



INDICE REPORT

1. DATI GENERALI	3
2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE	4
3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE.....	5
3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno.....	5
3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato	6
4. SEZIONE CANTIERI	7
4.1. Elenco cantieri fissi	7
4.1.1. CANTIERE STAZIONE	8
4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE	9
4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO	10
4.1.4. CANTIERE FORTEZZA	11
4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....	12
4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'	16
4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI	18
4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE	19
4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI	20

1. DATI GENERALI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE E DELLA STAZIONE ALTA VELOCITA' DEL NODO DI FIRENZE (LOTTO 2 dell'Affidamento a Contraente Generale).


COMMITTENTE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: NODAVIA, costituita dall'Associazione Temporanea di Imprese COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA (Capogruppo mandataria) - ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. (mandante)


- DATA INIZIO LAVORI PASSANTE	10/03/2010
- DATA INIZIO LAVORI STAZIONE	13/10/2010
- DATA ATTIVAZIONE PASSANTE E STAZIONE (contrattuale):	27/08/2015
- DATA FINE LAVORI (contrattuale):	15/11/2016

2. PROGRAMMA LAVORI GENERALE

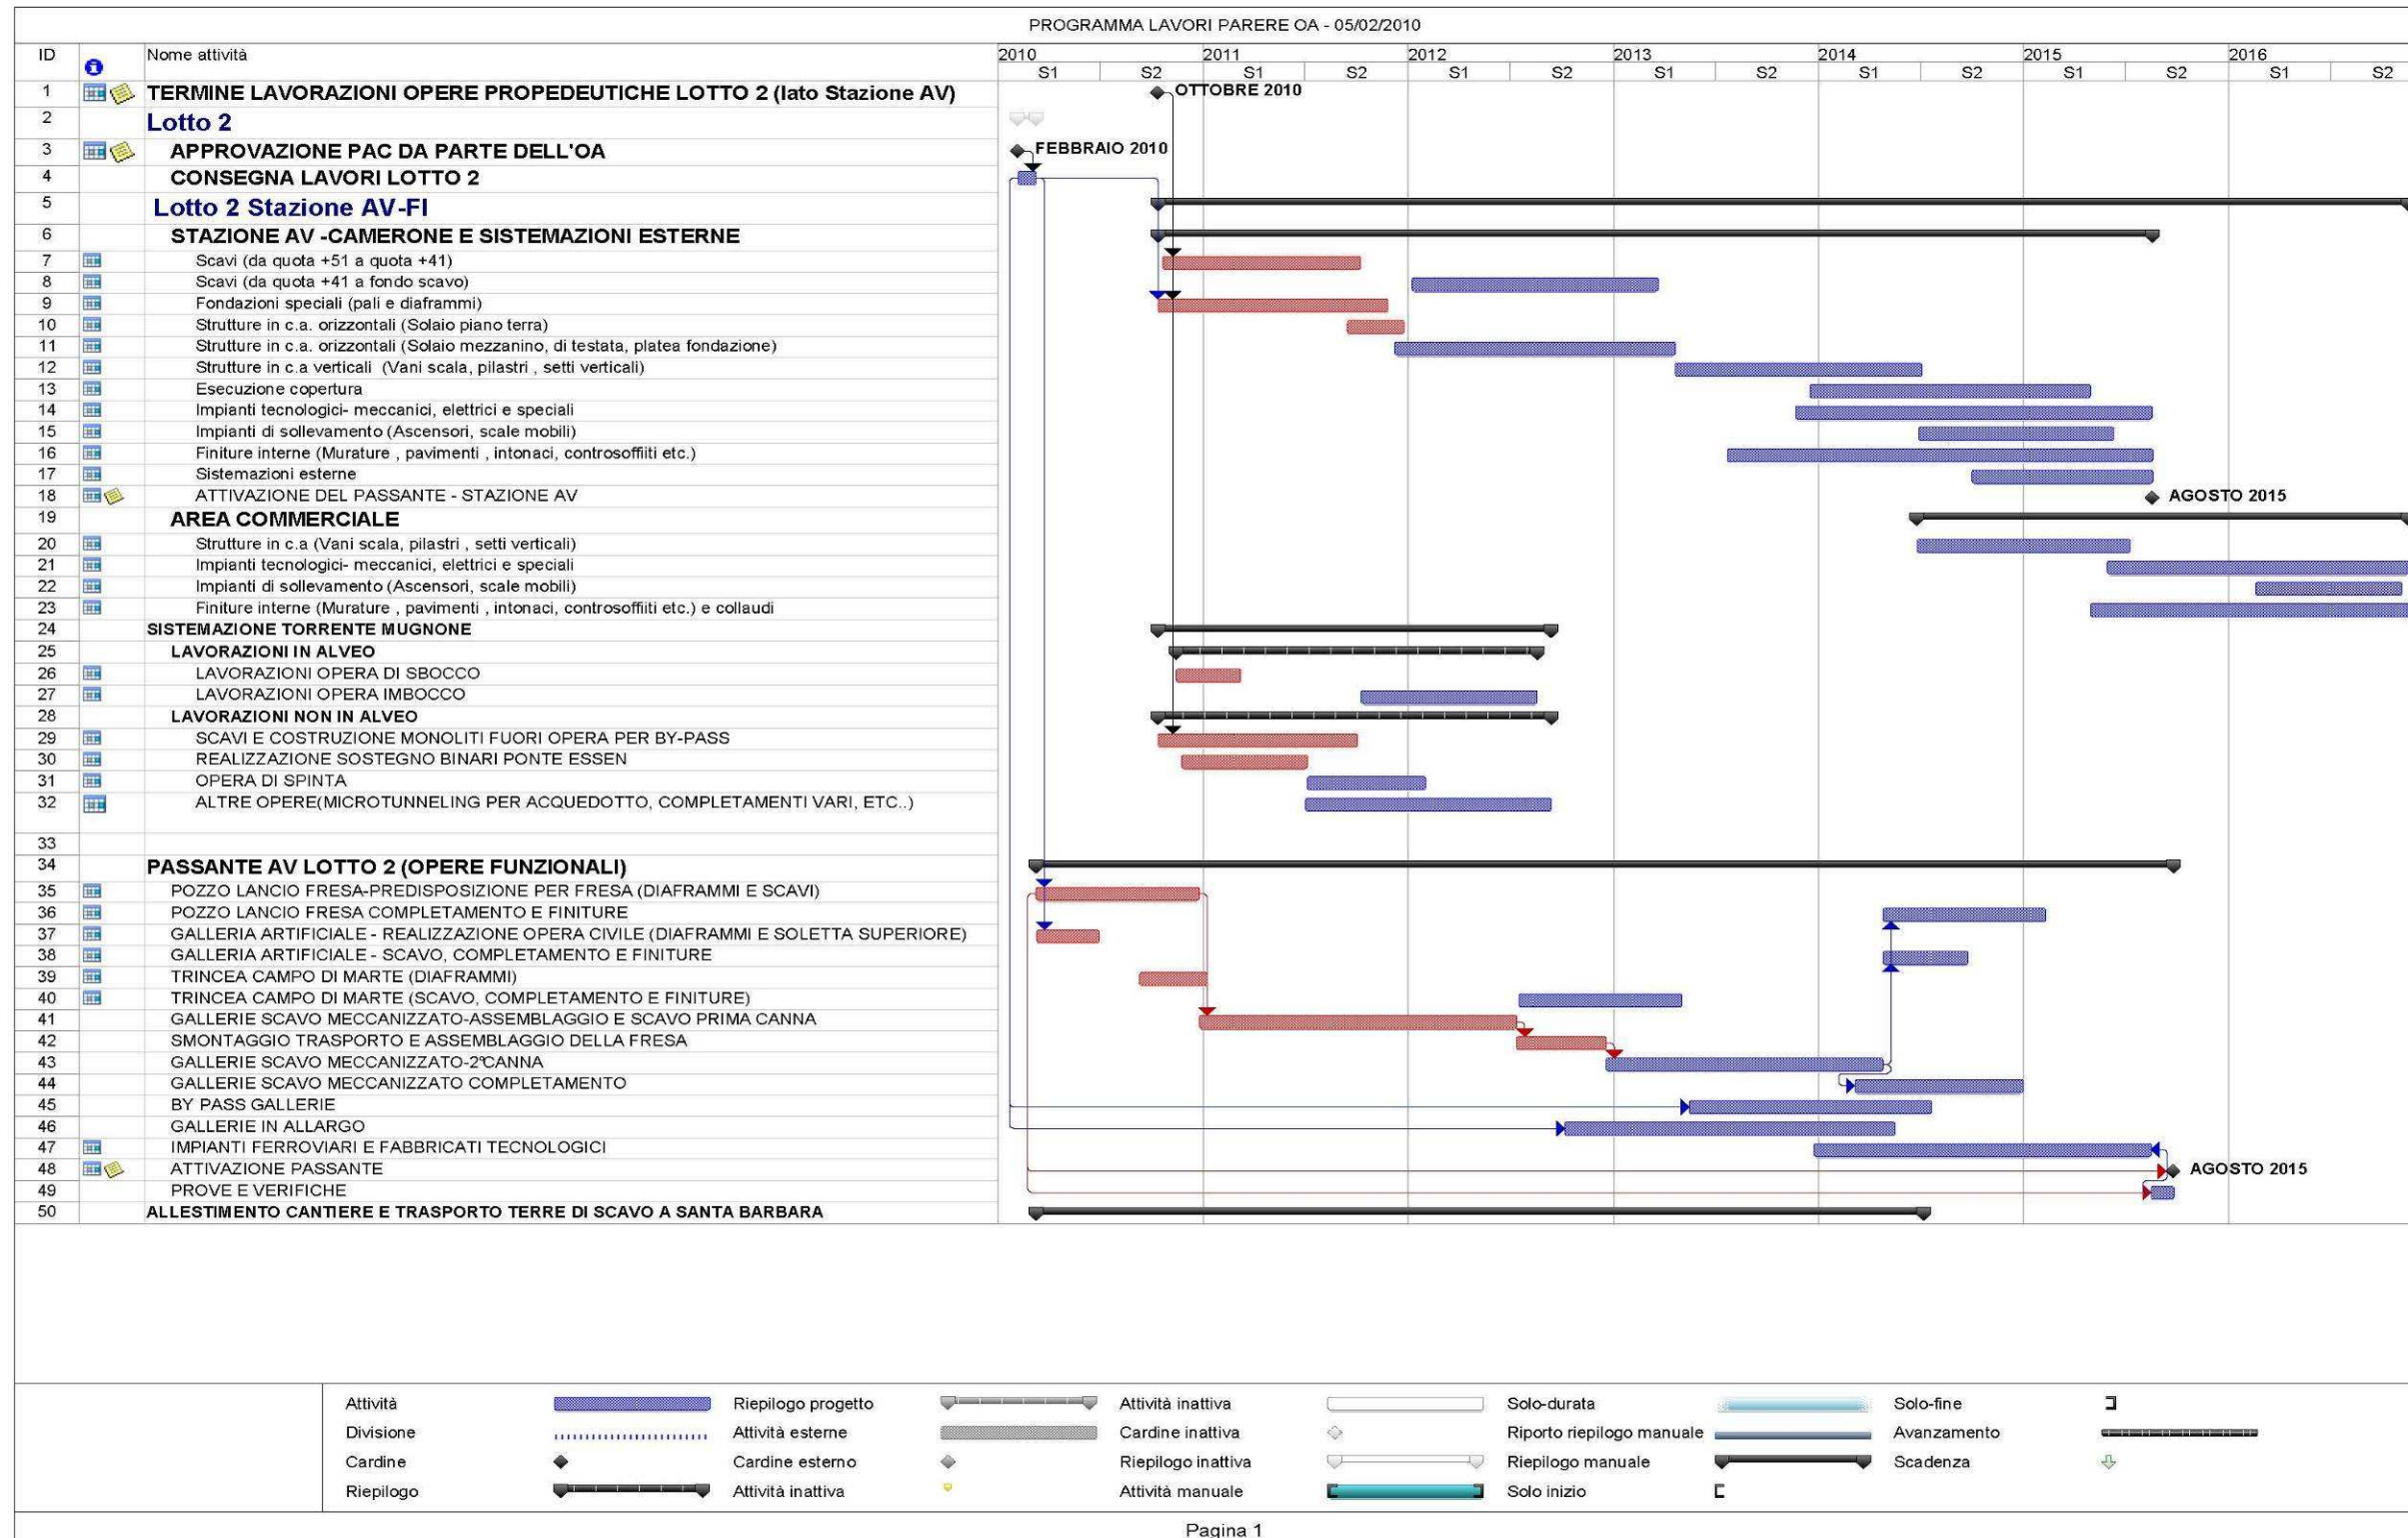

3. SEZIONE GENERALE: PASSANTE E STAZIONE

3.1. Cronoprogramma generale, intervallo temporale di un anno

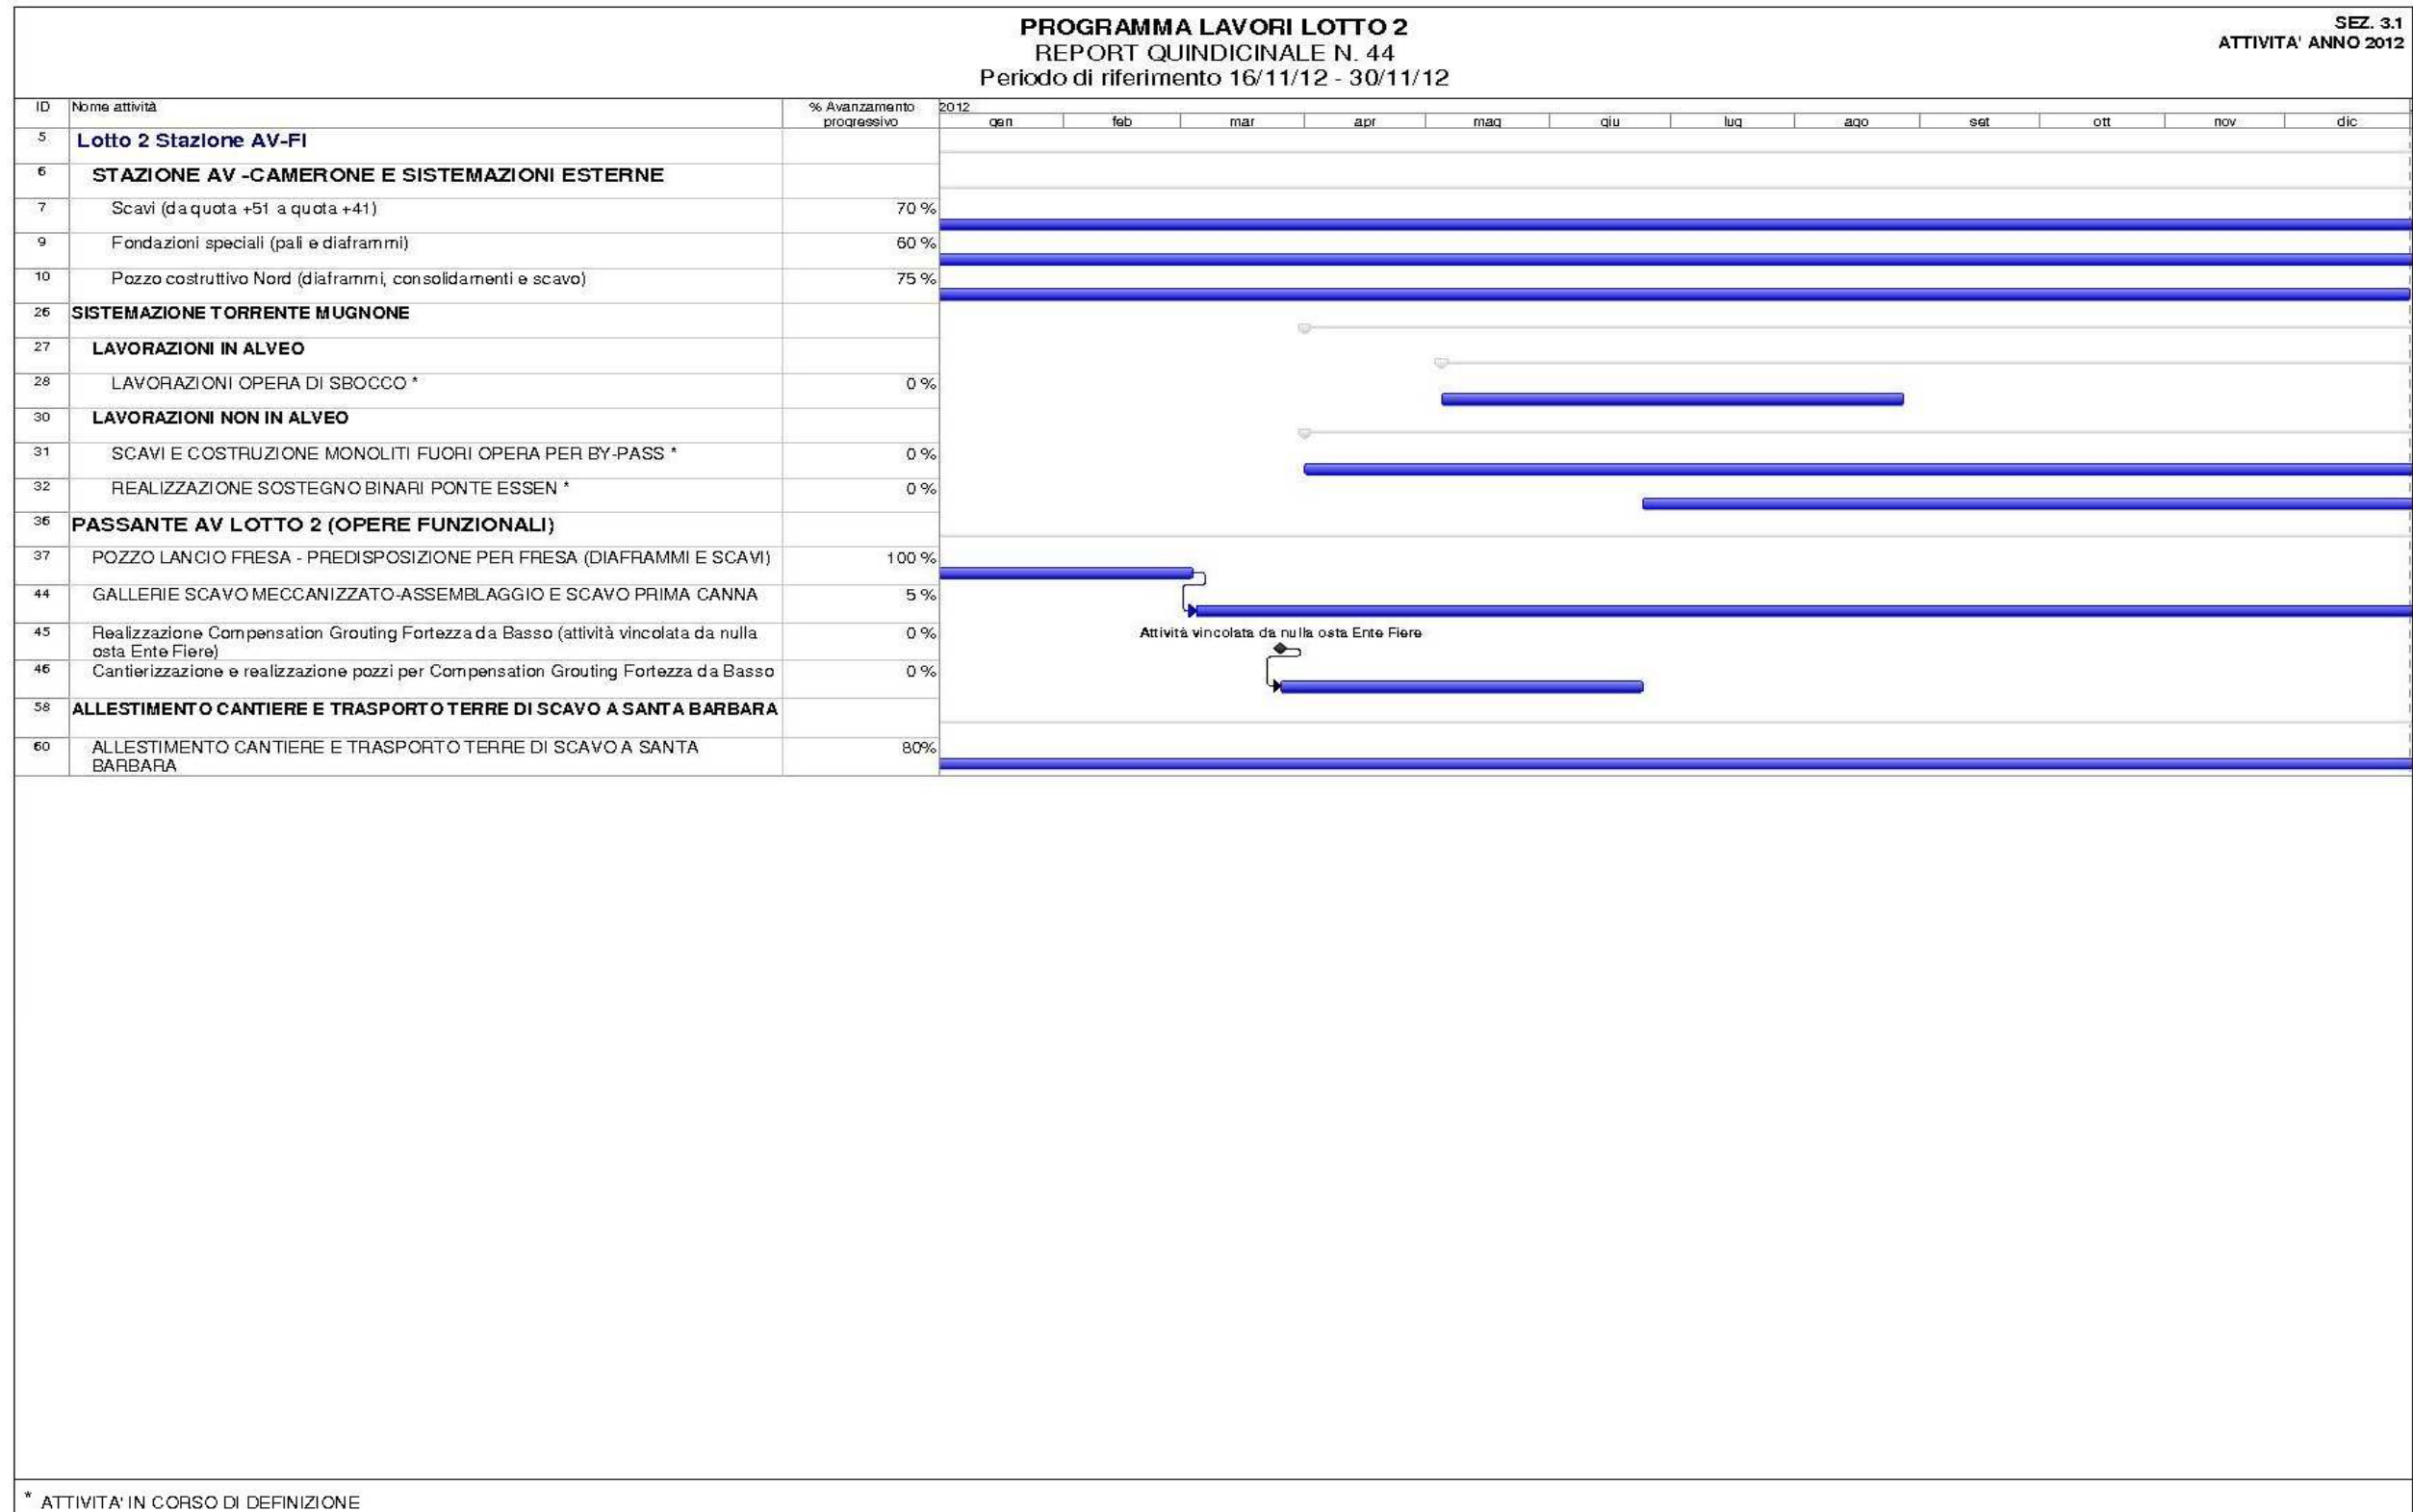

3.2. Eventuali anomalità e variazioni al Progetto approvato

4. SEZIONE CANTIERI

4.1. Elenco cantieri fissi

- **CANTIERE STAZIONE**
- **BY PASS MUGNONE**
- **CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO**
- **AREA FORTEZZA**

4.1.1. CANTIERE STAZIONE

CANTIERE STAZIONE AV

SEZ. 4.1.1

REPORT QUINDICINALE N.44

Periodo di riferimento: 16 Nov 2012 – 30 Nov 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - NOVEMBRE 2012	16-30 GIU	01-15 LUG	16-31 LUG	01-15 AGO	16-31 AGO	01-15 SET	16-30 SET	01-15 OTT	16-31 OTT	01-15 NOV	16-30 NOV	01-15 DIC	16-31 DIC	NOTE
SCAVI (da quota +51 a quota +41)	21/11/2011	18/02/2013	455	70%														Attività ripianificata a seguito di richieste Arpat
SCAVI (da quota +41 a fondo scavo)																		
FONDAZIONI SPECIALI (pali e diaframmi)	13/10/2010	12/08/2013	1035	60%														
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio piano terra)																		
STRUTTURE IN C.A. ORIZZONTALI (Solaio mezzanino, di testata, platea fondazione)																		
STRUTTURE IN C.A. VERTICALI (Vani scala, pilastri, setti verticali)																		
ESECUZIONE COPERTURA																		
IMPIANTI TECNOLOGICI - MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI																		
FINITURE INTERNE (Murature, pavimenti, intonaci, controsoffitti etc.)																		
POZZO COSTRUTTIVO NORD (diaframmi, consolidamenti e scavo)	09/08/2010	31/12/2012	876	75%														

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.2. CANTIERE BY PASS MUGNONE

CANTIERE BY PASS MUGNONE

SEZ. 4.1.2

REPORT QUINDICINALE N.44

Periodo di riferimento: 16 Nov 2012 – 30 Nov 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - NOVEMBRE 2012	16-30 GIU	01-15 LUG	16-31 LUG	01-15 AGO	16-31 AGO	01-15 SET	16-30 SET	01-15 OTT	16-31 OTT	01-15 NOV	16-30 NOV	01-15 DIC	16-31 DIC	NOTE
<u>LAVORAZIONI IN ALVEO</u>																		
LAVORAZIONI OPERA DI SBOCCO																		Attività in corso di definizione
LAVORAZIONI OPERA IMBOCCO																		
<u>LAVORAZIONI NON IN ALVEO</u>																		
SCAVI E COSTRUZIONE MONOLITI FUORI OPERA PER BY-PASS																		Attività in corso di definizione
REALIZZAZIONE SOSTEGNO BINARI PONTE ESSEN																		Attività in corso di definizione
OPERA DI SPINTA																		
ALTRE OPERE(MICROTUNNELING PER ACQUEDOTTO, COMPLETAMENTI VARI, ETC..)																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.3. CANTIERE CAMPO DI MARTE - SCAVO MECCANIZZATO

CANTIERE SCAVO MECCANIZZATO

SEZ. 4.1.3

REPORT QUINDICINALE N.44

Periodo di riferimento: 16 Nov 2012 – 30 Nov 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - NOVEMBRE 2012	16-30 GIU	01-15 LUG	16-31 LUG	01-15 AGO	16-31 AGO	01-15 SET	16-30 SET	01-15 OTT	16-31 OTT	01-15 NOV	16-30 NOV	01-15 DIC	16-31 DIC	NOTE
ASSEMBLAGGIO FRESA	03/03/2012	15/06/2012	104															Attività terminata
SCAVO BP TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV, CON ATTRAVERSAMENTO A PIENO)																		Valutazioni in corso a seguito Delibera Regionale n.316
MANUTENZIONE FRESA																		
SCAVO BP TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO FRESA A CAMPO DI MARTE																		
SCAVO BD TRATTO SUD (DA CAMPO DI MARTE A STAZIONE AV)																		
MANUTENZIONE FRESA																		
ATTRAVERSAMENTO A VUOTO NEL CAMERONE DI STAZIONE																		
SCAVO BD TRATTO NORD (DA STAZIONE A IMBOCCO SCAVALCO)																		
DISASSEMBLAGGIO E SMOBILITO FRESA																		

■ ATTIVITA' REALIZZATA
■ ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.1.4. CANTIERE FORTEZZA

CANTIERE AREA FORTEZZA

SEZ. 4.1.4

REPORT QUINDICINALE N.44

Periodo di riferimento: 16 Nov 2012 - 30 Nov 2012

	INIZIO	FINE	DURATA (gnc)	% AVANZAMENTO PROGRESSIVO - NOVEMBRE 2012	16-30 GIU	01-15 LUG	16-31 LUG	01-15 AGO	16-31 AGO	01-15 SET	16-30 SET	01-15 OTT	16-31 OTT	01-15 NOV	16-30 NOV	01-15 DIC	16-31 DIC	NOTE
<i>CS02A - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE RASTRIGLIA - FASE A</i>																		Attività in corso di programmazione
POZZI COMPENSATION N.3-4																		
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE (TAM)																		
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI																		
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI																		
<i>CS02C - OPERE CONSOLIDAMENTO FORTEZZA - BASTIONE CAVANIGLIA - FASE A</i>																		Attività in corso di programmazione
POZZI COMPENSATION N.1-2																		
PERFORAZIONI PER INSTALLAZIONE TUBI DI INIEZIONE																		
INIEZIONE DI PRE-TRATTAMENTO - BINARIO PARI																		
INIEZIONE DI COMPENSAZIONE - BINARIO PARI																		

	ATTIVITA' REALIZZATA
	ATTIVITA' DA REALIZZARE

4.2. PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

STAZIONE AV

Cantiere Operativo Stazione A.V.

- E' stata avviata la realizzazione dei pali di fondazione del camerone (foto1);
- Continuano le attività di realizzazione del Pozzo di Ventilazione Nord (foto 2 e 3).



Foto 1 – Pali di Fondazione



Foto 2 – Pozzo Nord

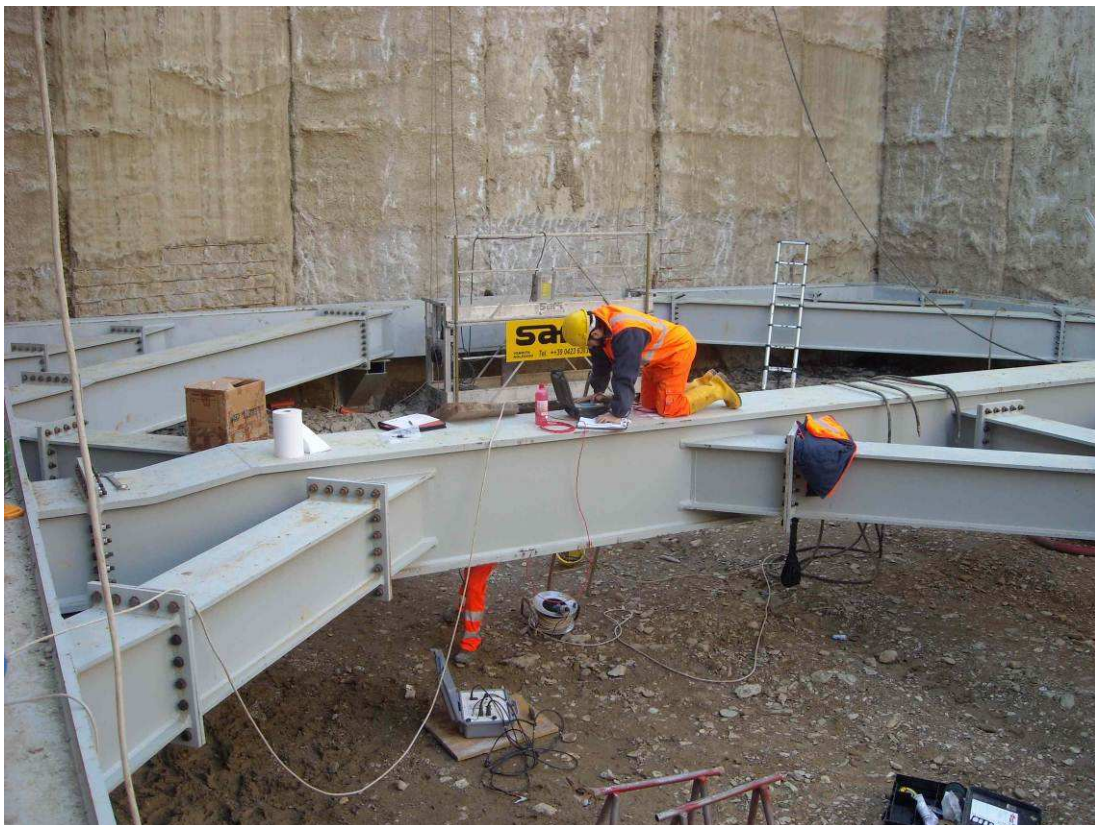


Foto 3 – Pozzo Nord

PASSANTE AV

Cantiere Operativo Campo di Marte e Terminal Bricchette – Opere in corso di realizzazione

- Sono in corso le attività di realizzazione delle coperture delle piazzole di caratterizzazione terre in località S. Barbara (foto 1 e 2).
- Sono in corso le attività della fase 2 del Terminal di Bricchette (foto 3).



Foto 1– Località S.Barbara – Piazzole di stoccaggio Fase 2 – Coperture



Foto 2 – Località Bricchette – Fase 2 Terminal e Copertura Piazzole



Foto 3 – Località Bricchette – Fase 2 Terminal

4.3. LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

SEZ. 4.3. - LAVORI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

CANTIERE	ZONA	LAVORI DA ESEGUIRE	TIPOLOGIA AUT. RICH.	PERIODO		AUT. GIA' RICHIESTA	DETERMINA AUTORIZZATA	NECES. EVENT. PROROGHE	NOTE	Elaborati di riferimento
				INIZIO	FINE					
Lotto 2 - ST	Viale Corsica	via di fuga	passo carrabile	01/09/2011	30/12/2017	SI	SI		restituzione area a fine lavori	Allegato n.1
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi incr. P.le Montelungo	Realizzazione Pozzo di compensation	restringimento corsia			NO			Attività in corso di riprogrammazione - durata prevista 3 mesi	
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi	Realizzazione Pozzo di compensation	chiusura corsia di superficie			NO			Attività in corso di riprogrammazione - durata prevista 3 mesi	
Lotto 2 - PA	Via L. Giordano	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Botticelli	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	SI	SI	SI	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Frà Barblommeo	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Masaccio	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Frà S. Maruffi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	SI	SI	SI (finita il 29/06/12)	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Giacomini	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via L. da Vinci	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Viale Don Minzoni	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Piazza della Libertà	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	2° semestre 2012	SI	SI (iniziata il 28/06/12)	SI	durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Viale S. Lavagnini	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	1° semestre 2012	SI	SI		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via C. Landino	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Poliziano	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	ago-12	SI	SI (iniziata il 16/07/12 e finita il 26/08)		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Bonifazi Lupi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	1° semestre 2012	ago-12	SI	SI (iniziata il 16/07/12 e finita il 26/08)		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Leone X	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Viale Strozzi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Dionisi	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	NO			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Delle Ghiaccie	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI	SI (iniziata 01/10/2012)		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Peri	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI	SI (iniziata 01/10/2012)		durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Cittadella	monitoraggi	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	SI			durata prevista 1 mese poi autorizzazioni a letture puntuali	
Lotto 2 - PA	Via Collina	campo Base Rovezzano	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	NO			Richiesta di autorizzazione in fase di formalizzazione - durata prevista 1 mese	
Lotto 2 - PA	Via Collina	campo Base Rovezzano	occupazione suolo pubblico	2° semestre 2012	2° semestre 2012	NO			Richiesta di autorizzazione in fase di formalizzazione - durata prevista 1 mese	

Allegato 1: Passo carrabile via di fuga Viale Corsica



4.4. ELENCO AUTORIZZAZIONI

SEZ. 4.4. - AUTORIZZAZIONI ENTI TERZI

Ente per rilascio autorizzazione	CANTIERE	TIPOLOGIA AUTOR. RICH.	AUT. GIA' RICHIESTA	DATA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE RILASCIATA	PERIODO		NOTE
						INIZIO	FINE	
COMUNE DI FIRENZE	CAMPO DI MARTE	DEROGA AL RUMORE	SI	06/05/2010	NO	-	-	In attesa dell'autorizzazione da parte del Comune già inviate le integrazioni in data 8/11/2010 e 30/11/2010
COMUNE DI FIRENZE	POZZO NORD	DEROGA AL RUMORE	SI	17/11/2010	NO	-	-	In attesa dell'autorizzazione da parte del Comune
PROVINCIA DI FIRENZE	CAMPO DI MARTE	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	-	-	in attesa autorizzazione concessione rilasciata proroga per prove di portata di ulteriori 6 mesi
COMUNE DI FIRENZE	STAZIONE AV	DEROGA AL RUMORE	SI	06/05/2010	NO	-	-	In attesa dell'autorizzazione da parte del Comune già inviate le integrazioni in data 12/1/2011
PROVINCIA DI FIRENZE	STAZIONE AV	RICHIESTA POZZI PRESA E RESA RICHIESTI DALL'OA IL 5.2.2010 PER LA CONTINUITA' DI FALDA	SI	11/11/2010	SI	-	-	in attesa autorizzazione concessione rilasciata proroga per prove di portata di ulteriori 6 mesi
AATO 3	PASSANTE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	SI	14/12/2011	14/12/2015	
PROVINCIA DI FIRENZE	POZZO NORD	RICHIESTA AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	11/11/2010	SI	23/04/2012	31/12/2013	
AATO 3	POZZO NORD	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	11/11/2010	SI	30/08/2012	30/08/2016	
PROVINCIA DI FIRENZE	PASSANTE AV	RICHIESTA AGGOTTAMENTO ACQUE INTERCLUSE NEL TERRENO	SI	11/11/2010	SI	24/04/2012	31/12/2013	PER LA G02, TR01 e GA03
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DILAVANTI	SI	17/07/2011	SI	30/08/2012	30/08/2016	PER AREA CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "A", CORRIDOIO ATTREZZATO RAMO "B", AREA EX CENTRALE DEL LATTE, AREA EX MACELLI, AREA BELFIORE
AATO 3	STAZIONE AV	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI	SI	18/07/2011	SI	30/08/2012	30/08/2016	

4.5. PRESCRIZIONI OSSERVATORIO AMBIENTALE

4.6. ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI

SEZ. 4.6.a. - ELENCO DITTE STAZIONE

aggiornamento 30/11/2012

ditte

A.T.I.: TRENITALIA S.p.A. Divisione CARGO - TRE T S.p.A.

A.T.I.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

AT Sistemi Tecnologici s.r.l.

COLABETON S.p.A.

ESSE.TI.A. S.r.l.

FOCARDI ANTONIO s.n.c.

GRAZZINI Cav. Fortunato S.p.A.

I.A.R. S.r.l.

ITALGRU' s.r.l.

MUGELLO LAVORI S.P.A.

SICURITALIA GROUP S.p.A.

TREVI S.p.A.

VARVARITO LAVORI s.r.l.

STN Studio

SEZ. 4.6.b. - ELENCO DITTE PASSANTE

aggiornamento 30/11/2012

ditte

A.T.I.: SWS Engineering S.p.A. - DURAZZANI S.r.l. - SONDEDILE S.r.l. - PIZZI TERRA S.r.l.

ALTOLAGO S.r.l.

AT-SISTEMI TECNOLOGICI S.r.l.

BI.MO. S.n.c.

CAF s.c.r.l.

CO.E.STRA S.p.A.

CO.I.INERTI S.r.l.

C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI s.c.a

ELETTRI-FER S.r.l.

FOCARDI ANTONIO s.n.c.

GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE s.rl. - CARDINALE s.r.l.

GRAZZINI Cav. F. S.p.A.

I.A.R. S.r.l.

INSA INTERNATIONAL SCAFFOLDING s.r.l.

SELI S.p.A.

SCAF s.c.r.l.

SCALA VIRGILIO & Figli S.p.A.

PREBETON S.p.A.

SICURITALIA GROUP S.p.A.

TECNOLOGICA S.r.l.

TECNOLAB s.r.l.

TECNO V.M. s.r.l. unipersonale

TERMOIDRAULICA PIERI S.r.l.

TOSCANA SCAVI

VARVARITO LAVORI s.r.l.
