COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AI QUARTIERI ED IMPIANTI SPORTIVI
P.O. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI –TECNICO MANUTENTIVA AMBITO B
Via delle Torri n° 23 - 50142 FIRENZE - tel. 055/2767178 - fax. 055/2767140

Oggetto: Edificazione Nuova Scuola Italo Calvino -2° fase-

c.o. 110166-110729-120071-120072-120382-120397 progetto n°108/2010

maggio 2012

PROGETTO ESECUTIVO
(definitivo strutturale)

ARC-CRO

Cronoprogramma

R.U.P.: Ing. Alessandro Dreoni

Progettisti: Ing. Riccardo Ricci
Arch. Daniele Squilloni - Geom. Giovanna Grazzini - Geom. Marco Noferi

Coordinatore Sic. Prog.: Geom. Marco Noferi

Impianti Meccanici
Progettisti: Ing. Filippo Cioni
P.I. Lorenzo Cappugi - P.I. Leonardo Mazzetti - P.I. David Cionini
P.I.Sandro Faggi
Collaborazione: Geom. Simone Rossi - Geom. Giovanni Pagano

Impianti Elettrici
Progettisti: P.I. Valter Masini
P.I. Fabio Calonaci - P.I. Martino Pinzauti - P.I. Nicola Riccarelli
Collaborazione: P.I. Fabio Bernardi

Prog. Strutturale: Ing. Marco Pio Lauriola
Collaborazione: Ing. Davide Vassallo - Ing. Ilaria Castellacci

DIREZIONE SERVIZI TECNICI COMUNE DI FIRENZE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI FIRENZE
DOTT. ING. MARCO PIO LAURIOLA
N. 4358

CANTIERE NUOVA SCUOLA CALVINO
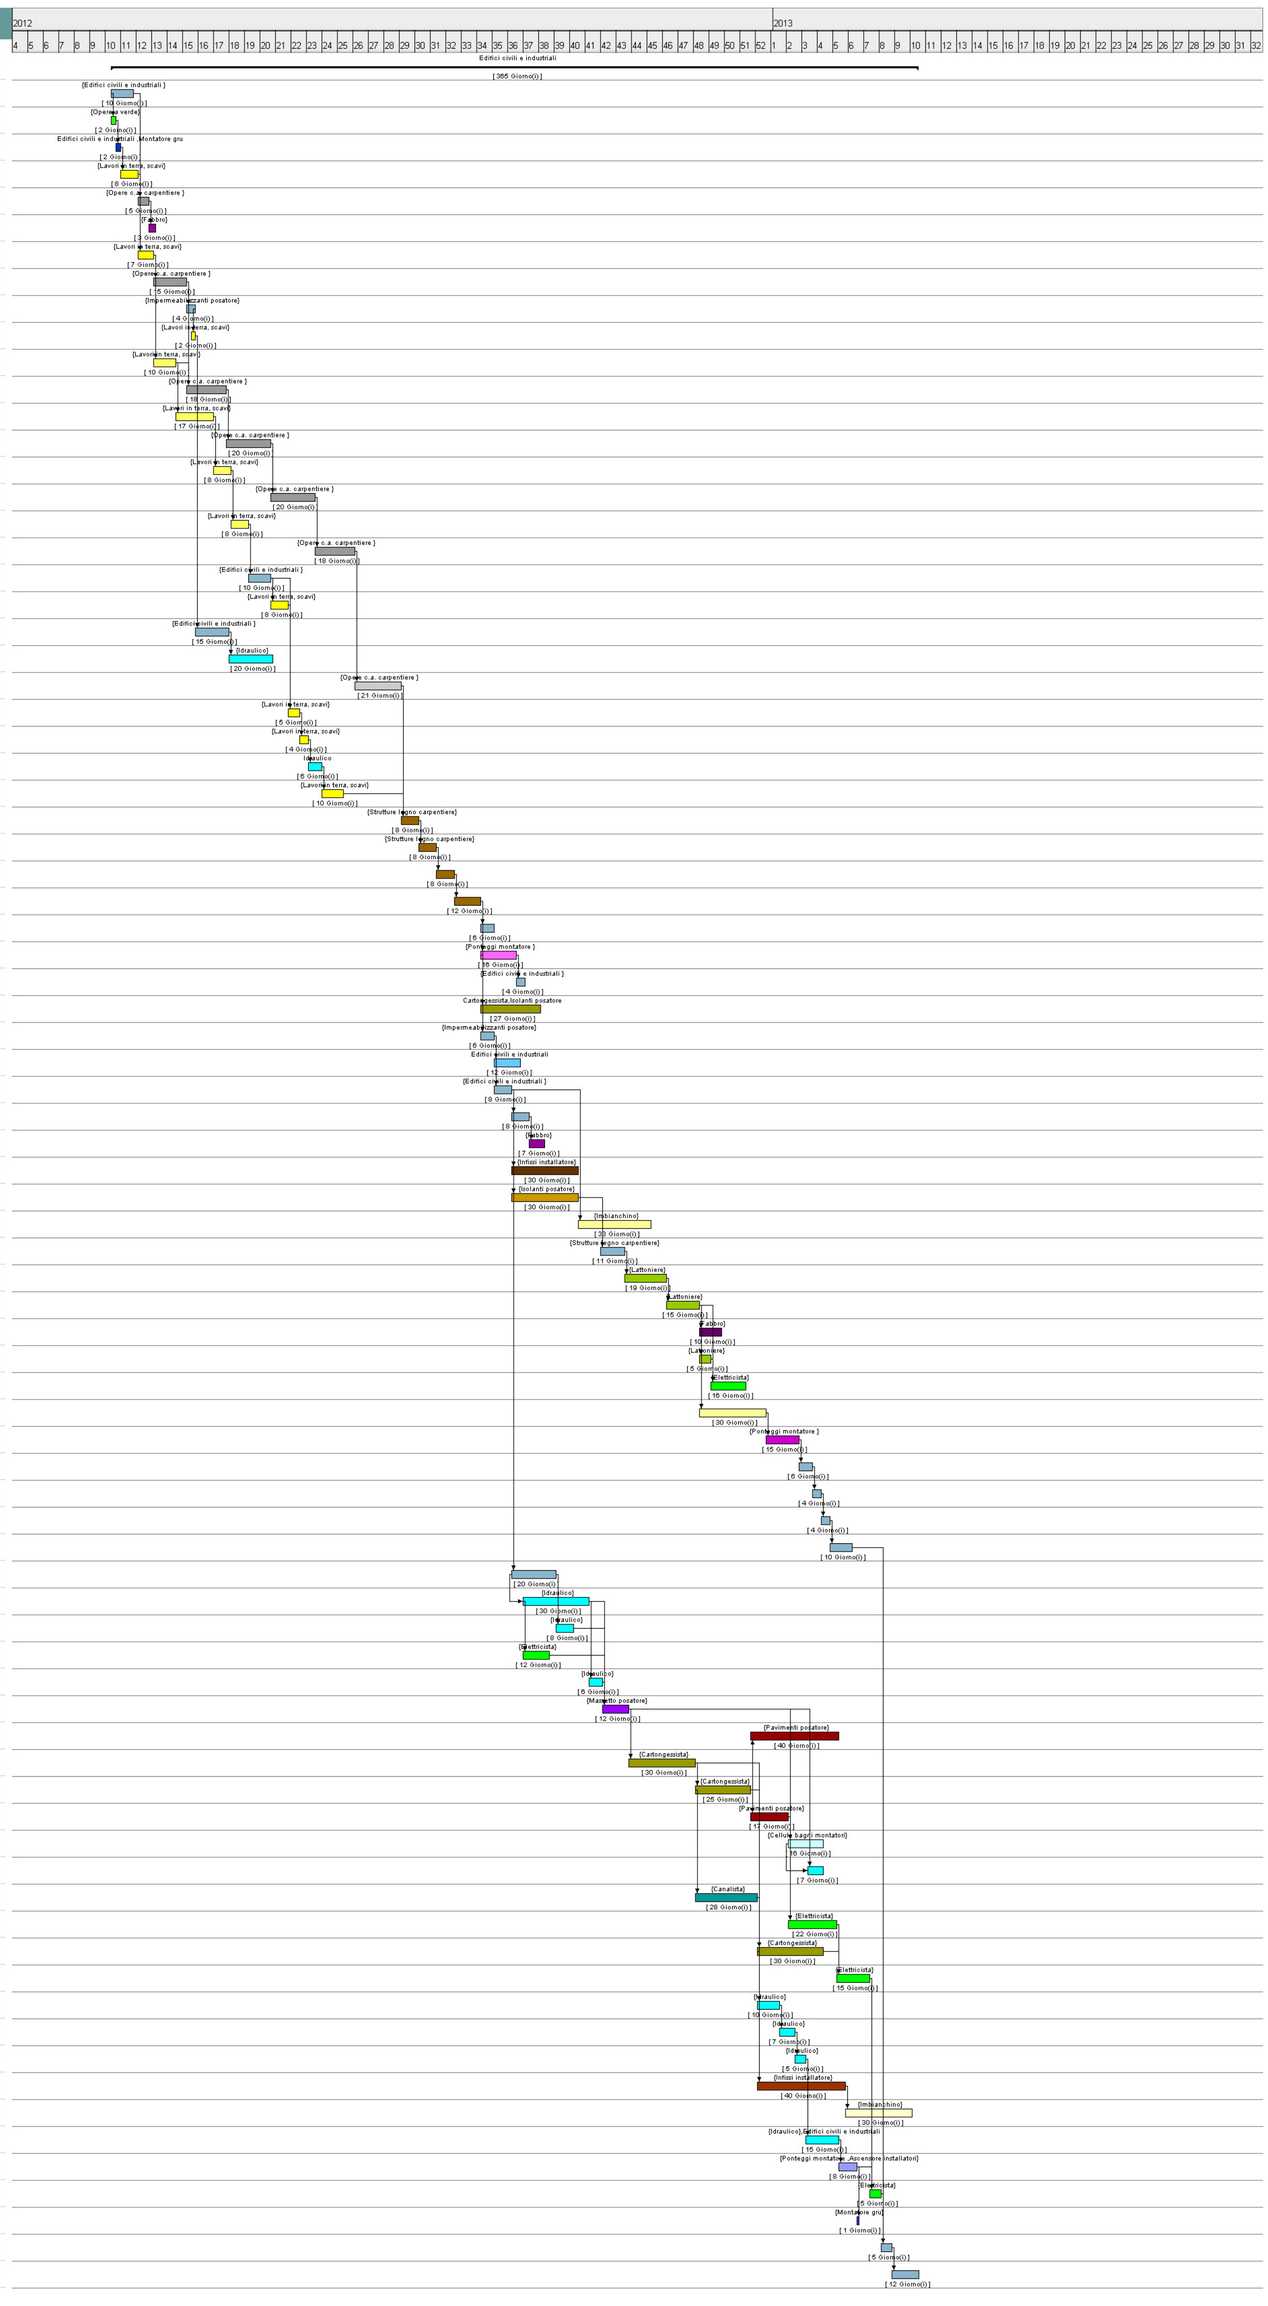
- APPRESTAMENTO CANTIERE, RECINZIONI, POSA BOX, FONDAZIONE PER GRU A TORRE
- ABBATTIMENTO ALBERI
- MONTAGGIO GRU A TORRE
- DEMOLIZIONI ESTERNE AL RUDERE
- NUOVO MURETTOIN C.A. RECINZIONE ASILO
- TAGLIO E RIPOSIZIONAMENTO RECINZIONE ASILO
- SCAVO PER TUNNEL CAVEDIO TECNICO
- TUNNEL IN C.A PER CAVEDIO TECNICO INTERRATO
- IMPERMEABILIZZAZIONE TUNNEL
- RINTERRO TUNNEL
- SCAVI INTERNI AL RUDERE 1
- FONDAZIONI E PILASTRI IN C.A. INTERNI AL RUDERE 1
- SCAVI ESTERNI AL RUDERE 1
- FONDAZIONI E PILASTRI IN C.A. ESTERNI AL RUDERE 1
- SCAVI INTERNI AL RUDERE 2
- FONDAZIONI E PILASTRI IN C.A. INTERNI AL RUDERE 2
- SCAVI ESTERNI AL RUDERE 2
- FONDAZIONI E PILASTRI IN C.A. ESTERNI AL RUDERE 2
- FOSSE BIOLOGICHE E RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE
- RINTERRO PARZIALE FONDAZIONI
- NUOVO VANO CENTRALE TERMICA
- MONTAGGIO TUBAZIONI IMP. MECC. DA C.T. A TETTO SCUOLA
- SOLAIO DEL PIANO TERRA IN LATEROCEMENTO
- RINTERRO FONDAZIONI E RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
- SCAVO PER NUOVA ALIMENTAZIONE GAS ED ENERGIA ELETTRICA
- POSA TUBAZIONE GAS
- FORMAZIONE MASSICCIATA VIABILITA' CANTIERE
- POSA STRUTTURA EDIFICIO IN PANNELLI PARETE DI LEGNO E SCALINI
- POSA STRUTTURA EDIFICIO IN PANNELLI SOLAIO E TAVOLATI DI DI LEGNO DI COPERTURA
- POSA STRUTTURA EDIFICIO IN PANNELLI PARETE DI LEGNO E SCALINI 2
- POSA STRUTTURA EDIFICIO TAVOLATI DI DI LEGNO DI COPERTURA
- POSA TELO IMPERMEABILE IN COPERTURA
- MONTAGGIO PONTEGGI
- COMIGNOLI E SFIATI
- POSA PARETI ESTERNE DI TAMPONAMENTO A SECCO
- MASSETTO BALCONI
- SOLAIO PIANO INTERRATO SU CUPOLOTTI
- POSA SOGLIE
- IMPERMEABILIZZAZIONI E POSA PAVIMENTI BALCONI
- POSA RINGHIERE BALCONI
- POSA INFISSI ESTERNI
- POSA ISOLANTE E RASATURA CAPPOTTO DI FACCIATA
- FINITURA CEMENTIZIA SU CAPPOTTO DI FACCIATA
- POSA ISOLANTI SU COPERTURE
- POSA MANTO METALLICO DI COPERTURA
- POSA DI GRONDE, SCOSSALINE E TUBI PLUVIALI
- POSA FRANGISOLE IN GRONDA
- POSA LINEE VITA
- POSA FOTOVOLTAICO (OFF MIGLIORATIVA)
- TINTEGGIATURA CAPPOTTO
- SMONTAGGIO PONTEGGI
- COMPLETAMENTO RETE ESTERNA DI SMALTIMENTO
- CORDONATO MARCIAPIEDE E CANALETTA
- SOLETTA IN CLS ESTERNA MARCIAPIEDE
- POSA PAVIMENTI MARCIAPIEDE
- POSA ISOLANTI INTERNI A PAVIMENTO
- POSA PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
- POSA RETI ORIZZONTALI DI ADDUZIONE E SCARICO IMPIANTO IDROSANITARIO SU SOLAI
- POSA CAVIDOTTI ORIZZONTALI SU SOLAI PER IMPIANTI ELETTRICI
- POSA IMPIANTO TERMICO A RADIATORI
- MASSETTO INTERNO GETTATO IN OPERA
- POSA PAVIMENTI INTERNI
- POSA PARETI INTERNE A SECCO
- POSA CONTROPARETI INTERNE A SECCO
- POSA RIVESTIMENTI INTERNI
- POSA TRAMEZZI PREFABBRICATI E SANITARI CELLULE BAGNI
- POSA IMPIANTI TERMO IDRAULICI
- POSA IMPIANTI AREAZIONE PRIMARIA
- POSA LINEE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- POSA CONTROSOFFITTI
- POSA PLAFONIERE E CORPI ILLUMINANTI
- POSA MACCHINE UTA E SCAMBIATORI DI CALORE
- POSA CALDAIE, SERBATOI
- POSA PANNELLI SOLARI TERMICI
- POSA INFISSI INTERNI E FINITURE
- TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA
- POSA APPARECCHIATURE IMPIANTI MECCANICI E SPECIALI
- POSA ASCENSORE
- POSA APPARECCHIATURE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- SMONTAGGIO GRU A TORRE
- OPERE STRADALI
- SMOBILIZZO CANTIERE
